

# 施工工程ダイジェスト版

工事名: 令和2・3年度 小内海地区歩道整備工事

## 着手前



## 完成



## R3.9月度

9月度の主な作業内容としては、ガードケーブルの撤去及び敷き鉄板の設置や仮設転落防止構等の設置を行いました。




## R3.10月度

10月度の主な作業内容としては、岩盤面を重機を使用し破碎しながらの掘削作業及び基礎地盤面へコンクリートの打設を行いました。



## R3.11月度

11月度の主な作業内容としては、大型ブロックの設置及び調整コンクリートの型枠組立、コンクリートの打設を行いました。

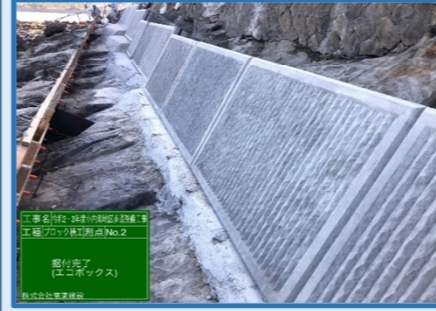

## R3.12月度

12月度の主な作業内容としては、組立歩道の設置及び路盤工、縁石の設置、転落防止構等の設置を行いました。



## R4.1月度

1月度の主な作業内容としては、ガードパイプの設置及び歩道部、車道路肩部のアスファルト舗装工を行いました。

